

大学記念館の改修工事（概要）

大学記念館の改修工事は、昨年に続き、今年度は主に図書室資料、保管室等資料の保存、建物の外壁等、建物を中心に行なった。具体的には、次の通りである。

1. 図書室・情報室改修工事

ブラインド、展示物の撤去を行い、床の既設ビニール床シートを撤去しタイルカーペットに張替え、窓のブラインド取替え、既存の照明に加え4台の照明器具の増設工事を行った。

2. 書院図書資料室改修工事

既設天井板の下地を調整した後にせっこうボードを張りEP塗り、床の既設ビニール床シートを撤去しビニール床シート張り、窓を外側はポリ合板、内側はせっこうボードにEP塗りで塞ぎ、既存の照明に加え6台の照明器具の増設と床置型のエアコン取替え、除湿機（3台）の新設工事を行った。

3. 資料保管室改修工事

既設天井板の下地を調整した後にEP塗り替え、床の既設ビニール床シートを撤去しビニール床シート張り、窓を外側はポリ合板、内側はせっこうボードにEP塗りで塞ぎ、既存の照明に加え2台の照明器具の増設と壁掛け式のエアコン取替え・除湿機の新設工事を行った。

4. 大学史研究室改修工事

既設天井板の下地を調整した後にEP塗り替え、床の既設タイルカーペットを撤去しタイルカーペットを張替え、扉をせっこうボードにEP塗りで塞ぎ、床置型のエアコン取替え工事を行った。

5. 大学史事務室・資料室改修工事

塗壁の下地を調整した後にEP塗り、それに伴い巾木と窓の額縁のSOP塗り替え 床の既設ビニール床シートを撤去しビニール床シート張、窓のブラインド取替え、既設の照明器具4台を撤去しより照度のある器具を4台新設した。

6. 大学史展示室C改修工事

ブラインド、木製棚の撤去を行い、既設天井板の下地を調整した後にEP塗り替え、壁上部は既設塗壁を下地調整しEP塗りその他の壁はせっこうボード張りの上化粧シートに張、床の既設ビニール床シートを撤去しタイルカーペットに張替え、窓を外側はポリ合板、内側はせっこうボードにEP塗りで塞ぎ、ピクチャーレールの新設、既設の照明器具を撤去し展示室用の照明器具に取替え、壁掛け式のエアコン取替え工事を行った。




改修後の展示室C

7. 東亜同文書院大学記念センター事務局改修工事

床の既設ビニール床シートを撤去しタイルカーペットに張替え、窓のブラインド取替え工事を行った。

8. 廊下改修工事

資料室、展示室入口のドアのランマ部分のガラスを強化ガラスに取替え、資料室、展示室の窓を利用して掲示板の新設を行った。

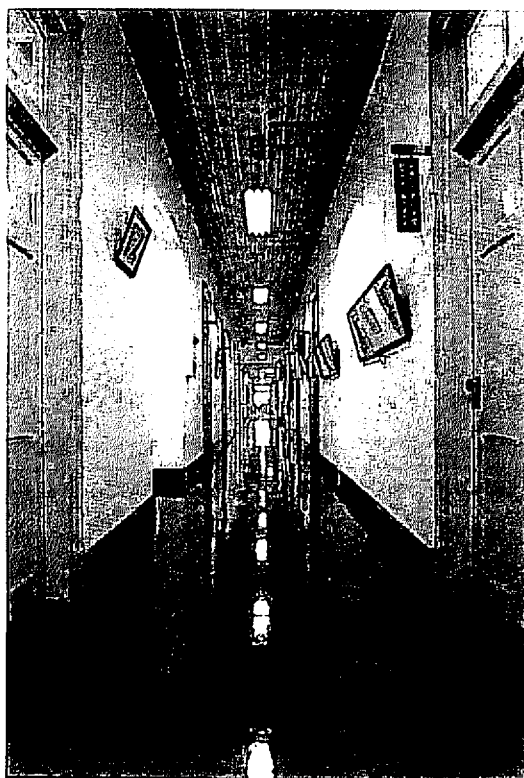

改修後の廊下

9. スロープ設置工事

建物西側の出入口前に、鉄筋コンクリートでスロープを設置した。

10. 東亜同文書院大学記念センター第1.2.3.展示室改修工事

既設天井板の下地を調整した後にEP塗り替えを行った。

11. 東面外壁塗替え工事

既設杉板張りの破損部分を取り替えて 下地調整しSOP塗り（2回塗）を行った。

12. 南面外壁塗替え工事

既設杉板張りの破損部分を取り替えて 下地調整しSOP塗り（2回塗）を行った。

(以上豊橋総務課)



外壁改装後の大学記念館
